

神栖市における有機ヒ素汚染地下水対策についてのお知らせ

現場の進捗状況について

地下水処理施設の建設に向けて今月8日より現場で土木工事(敷地造成)を開始しております。

現場周辺には交通誘導員を配置し、周辺住民の皆様の安全を第一として作業を行っております。



写真：構内敷地造成及び排水溝施工状況

今後の作業予定等について

(1) 今後の作業予定について

【12月の作業予定】

8日から開始した処理施設建設現場の敷地造成工事・排水溝設置及び場内の舗装・フェンス設置工事は今月26日までに終了します。

背面搬入道路の仮設舗装工事は、15日から開始し、今月26日までに終了します。

管理棟、処理棟の建築工事の土工事は、15日から開始し、年内に基礎工事に着手します。

【1月以降の作業予定】

前面道路の仮設舗装工事は、1月中旬から開始します。

場内電気引込工事は、1月下旬から実施します。

上水道引込工事は、1月6日～中旬にかけて実施します。

下水道放流管敷設工事は、1月6日～2月下旬にかけて実施します。


(2) 連絡事項(年末年始の現場作業)

12月27日から1月5日まで現場作業は全休とします。休止期間中は1日1回パトロールを行い、現場の状況について確認します。

新年は、1月6日より工事を開始します。

工事工程表

工種	年 月	平成20年12月			平成21年1月			
		10	20	27	5	10	20	31
準備工		—————			年 末 年 始 休 止			
土木工事	敷地造成	—————						
	場内排水溝		—————					
	場内舗装		—————					
建築工事	処理棟		—————				—————	
	管理棟		—————				—————	
機械設備工事	貯留槽基礎						—————	
配管設備工事	上水道工事						—————	
	下水道工事						—————	
電気計装設備工事	受電設備						—————	
工事用仮設道路	前面道路					—————		
	背面道路		—————					

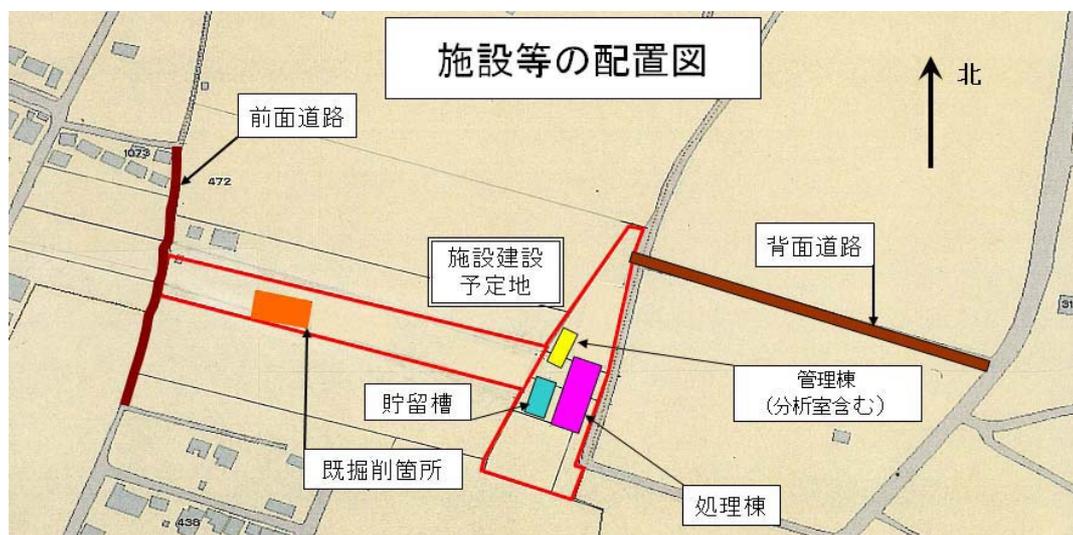

近隣の皆様には、ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。

お問い合わせ・ご質問は下記の窓口へご連絡下さい。

(株)鴻池組現場事務所	TEL:0299-92-4467	FAX:0299-92-4468
茨城県環境対策課	TEL:029-301-2966	FAX:029-301-2969
神栖市環境課	TEL:0299-90-1146	FAX:0299-92-4917
環境省環境リスク評価室	TEL:03-5521-8262	FAX:03-3581-3578

年末年始休止期間中の連絡先：(株)鴻池組 松原代理人 (090-3996-1172)
