


公害防止対策事業の進捗状況について

令和 2 年 10 月

事業の進捗状況について（全体）

- 公害防止対策事業実施地域において平成23年に計画期間内で予定されていた事業に係る総費用は約4兆7108億円であった。令和元年度末時点で約3兆6773億円が執行され、事業費ベースでは予定されていた事業の8割（78%）が実施された。
- 同様のペースで事業の執行が進んだ場合、計画終期である令和2年度末においては予定されていた事業の9割（87%）を終えると見込まれる。

公害防止対策事業実施地域における事業全体の進捗状況

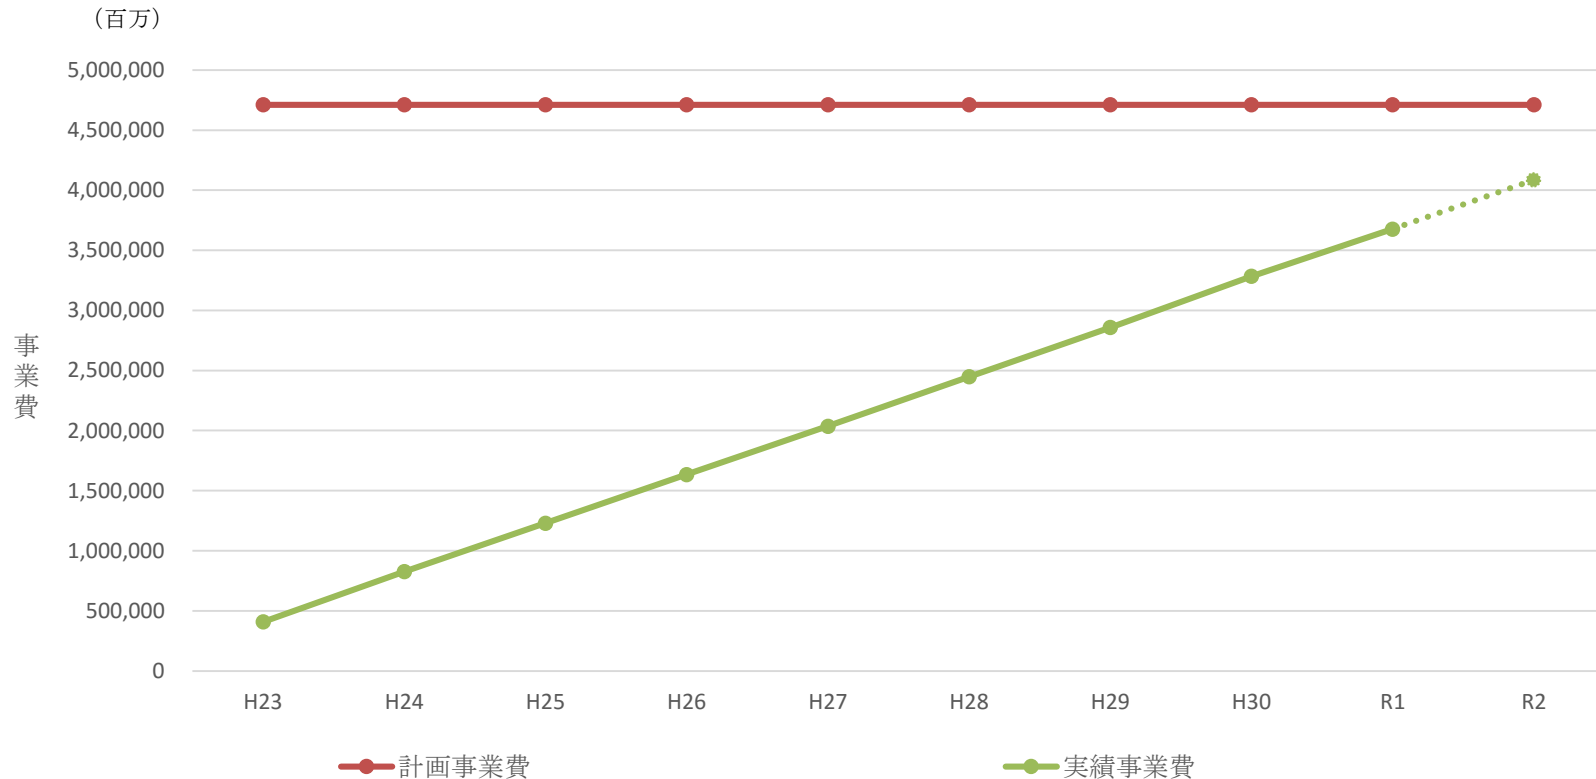

事業の進捗状況（下水道）

- 公害防止対策事業実施地域において平成23年に計画期間内で予定されていた下水道事業に係る総費用は約4兆6355億円（全体比98%）であった。令和元年度末時点で約3兆6233億円が執行され、事業費ベースでは予定されていた事業の8割（78%）が実施された。
- 同様のペースで事業の執行が進んだ場合、計画終期である令和2年度末においては予定されていた事業の9割（87%）を終えると見込まれる。


下水道事業の進捗状況



事業の進捗状況（浚渫・導水等）

- 公害防止対策事業実施地域において平成23年に計画期間内で予定されていた浚渫・導水等事業に係る総費用は約692億円（全体比1.47%）であった。令和元年度末時点で約487億円が執行され、事業費ベースでは予定されていた事業の7割（70%）が実施された。
- 同様のペースで事業の執行が進んだ場合、計画終期である令和2年度末においては予定されていた事業の8割（78%）を終えると見込まれる。

浚渫・導水等事業合計

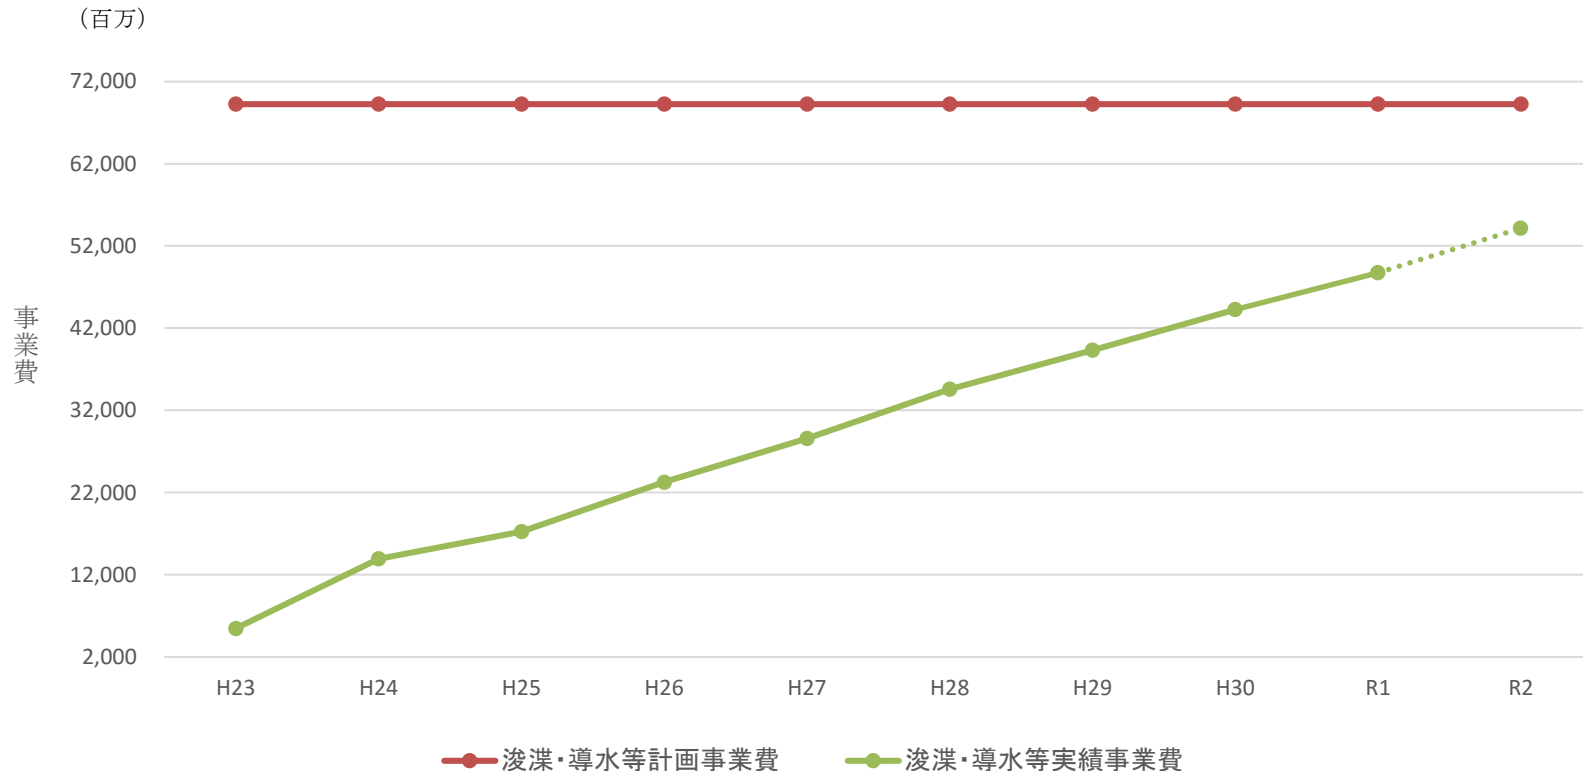

事業の進捗状況（公害対策土地改良）

- 公害防止対策事業実施地域において平成23年に計画期間内で予定されていた公害対策土地改良事業に係る総費用は約60億円（全体比0.13%）であった。令和元年度末時点で約53億円が執行され、事業費ベースでは予定されていた事業の9割（88%）が実施された。
- 同様のペースで事業の執行が進んだ場合、計画終期である令和2年度末においては予定されていた事業のほぼ全て（98%）を終えると見込まれる。

公害対策土地改良事業の進捗状況

