

令和6年度能登半島地震および 奥能登豪雨に関する復旧・復興への 現状と取組について



一般社団法人
石川県構造物解体協会

【目次】

- ・ 一般社団法人 石川県構造物解体協会について
- ・ 令和6年度能登半島地震及び奥能登豪雨に関する復旧・復興に向けた現状について
- ・ 今後の大規模災害に向けた対策について

・一般社団法人 石川県構造物解体協会について

名 称	石川県構造物解体協会	一般社団法人 石川県構造物解体協会
代 表 者	代 表 今 村 照 男	会 長 今 村 秀 憲
設立年月日	平成10年3月20日	平成29年6月7日
協 会 員	設立時 9 社	設立時11社 → 現在25社
役 員 数 等	役員数7名 (定数・会長1名・副会長2名・専務理事1名・理事若干名・監事2名)	役員数11名 (定数・理事3名以上10名以内 理事のうち1名代表理事・監事3名以内)
目 的	構造物解体協会の向上発展及び、会員相互の親睦、融和を図ることを目的とする。	
そ の 他	協会員数の経緯	
	平成15年4月	協会員24社 賛助会員 4社
	平成20年4月	協会員25社 賛助会員21社
	平成28年4月	協会員24社 賛助会員18社
	平成29年6月	一般社団法人化
	平成29年4月	協会員24社 賛助会員33社
	平成31年4月	協会員26社 賛助会員36社
	令和 5 年6月	協会員25社 賛助会員40社
	令和 6 年6月	協会員25社 賛助会員47社
	主な事業内容	
・ 建物解体工事技術等に関する調査・研究		
・ 解体工事業の合理化・近代化のための調査		
・ 先進県解体現場への研修会実施		
・ 石川県交通安全協会へ反射タスキの寄贈		
・ 解体工事に関する講習会・研修会の開催		
・ その他		

1 | 令和6年能登半島地震の概要

令和6年1月1日(月)16時10分頃、石川県能登地方を震源とするマグニチュード7.6の地震が発生しました。この地震により、石川県輪島市や志賀町で最大震度7を観測したほか、能登地方の広い範囲で震度6強や6弱の揺れを観測しました。

今回の地震により、石川県能登で大津波警報が発表され、金沢の観測点で80cmの津波を観測したほか、能登町や珠洲市で4m以上の津波の浸水高を観測するなど、能登半島の広い地域で津波による浸水が認められました。

1月1日以降、県内では震度1以上の余震が6月14日時点で1,871回観測されています。

(1)発生時刻 令和6年1月1日16時10分頃

(2)震源地 石川県能登地方(震源の深さ 約16km)

(3)地震の規模 マグニチュード7.6

(4)県内の震度・震度7 : 輪島市、志賀町

・震度6強: 七尾市、珠洲市、穴水町、能登町


・震度6弱: 中能登町

・震度5強: 金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、能美市、宝達志水町

・震度5弱: 白山市、津幡町、内灘町

・震度4 : 野々市市、川北町

図1 震度分布図

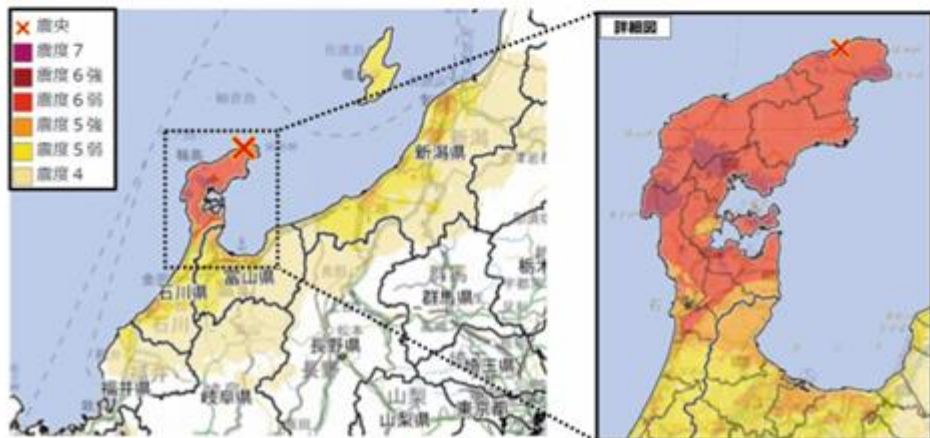

出典:気象庁ホームページ(https://www.jma.go.jp/basai/map.html?6/36.781/137.42&contents=estimated_intensity_map&id=202401011610)
推計震度分布を加工して作成

※石川県HPから



大雨被害の概況(R6.9)




※石川県HPから



令和6年奥能登豪雨による通行止め箇所

※石川県HP（危機管理監室より）

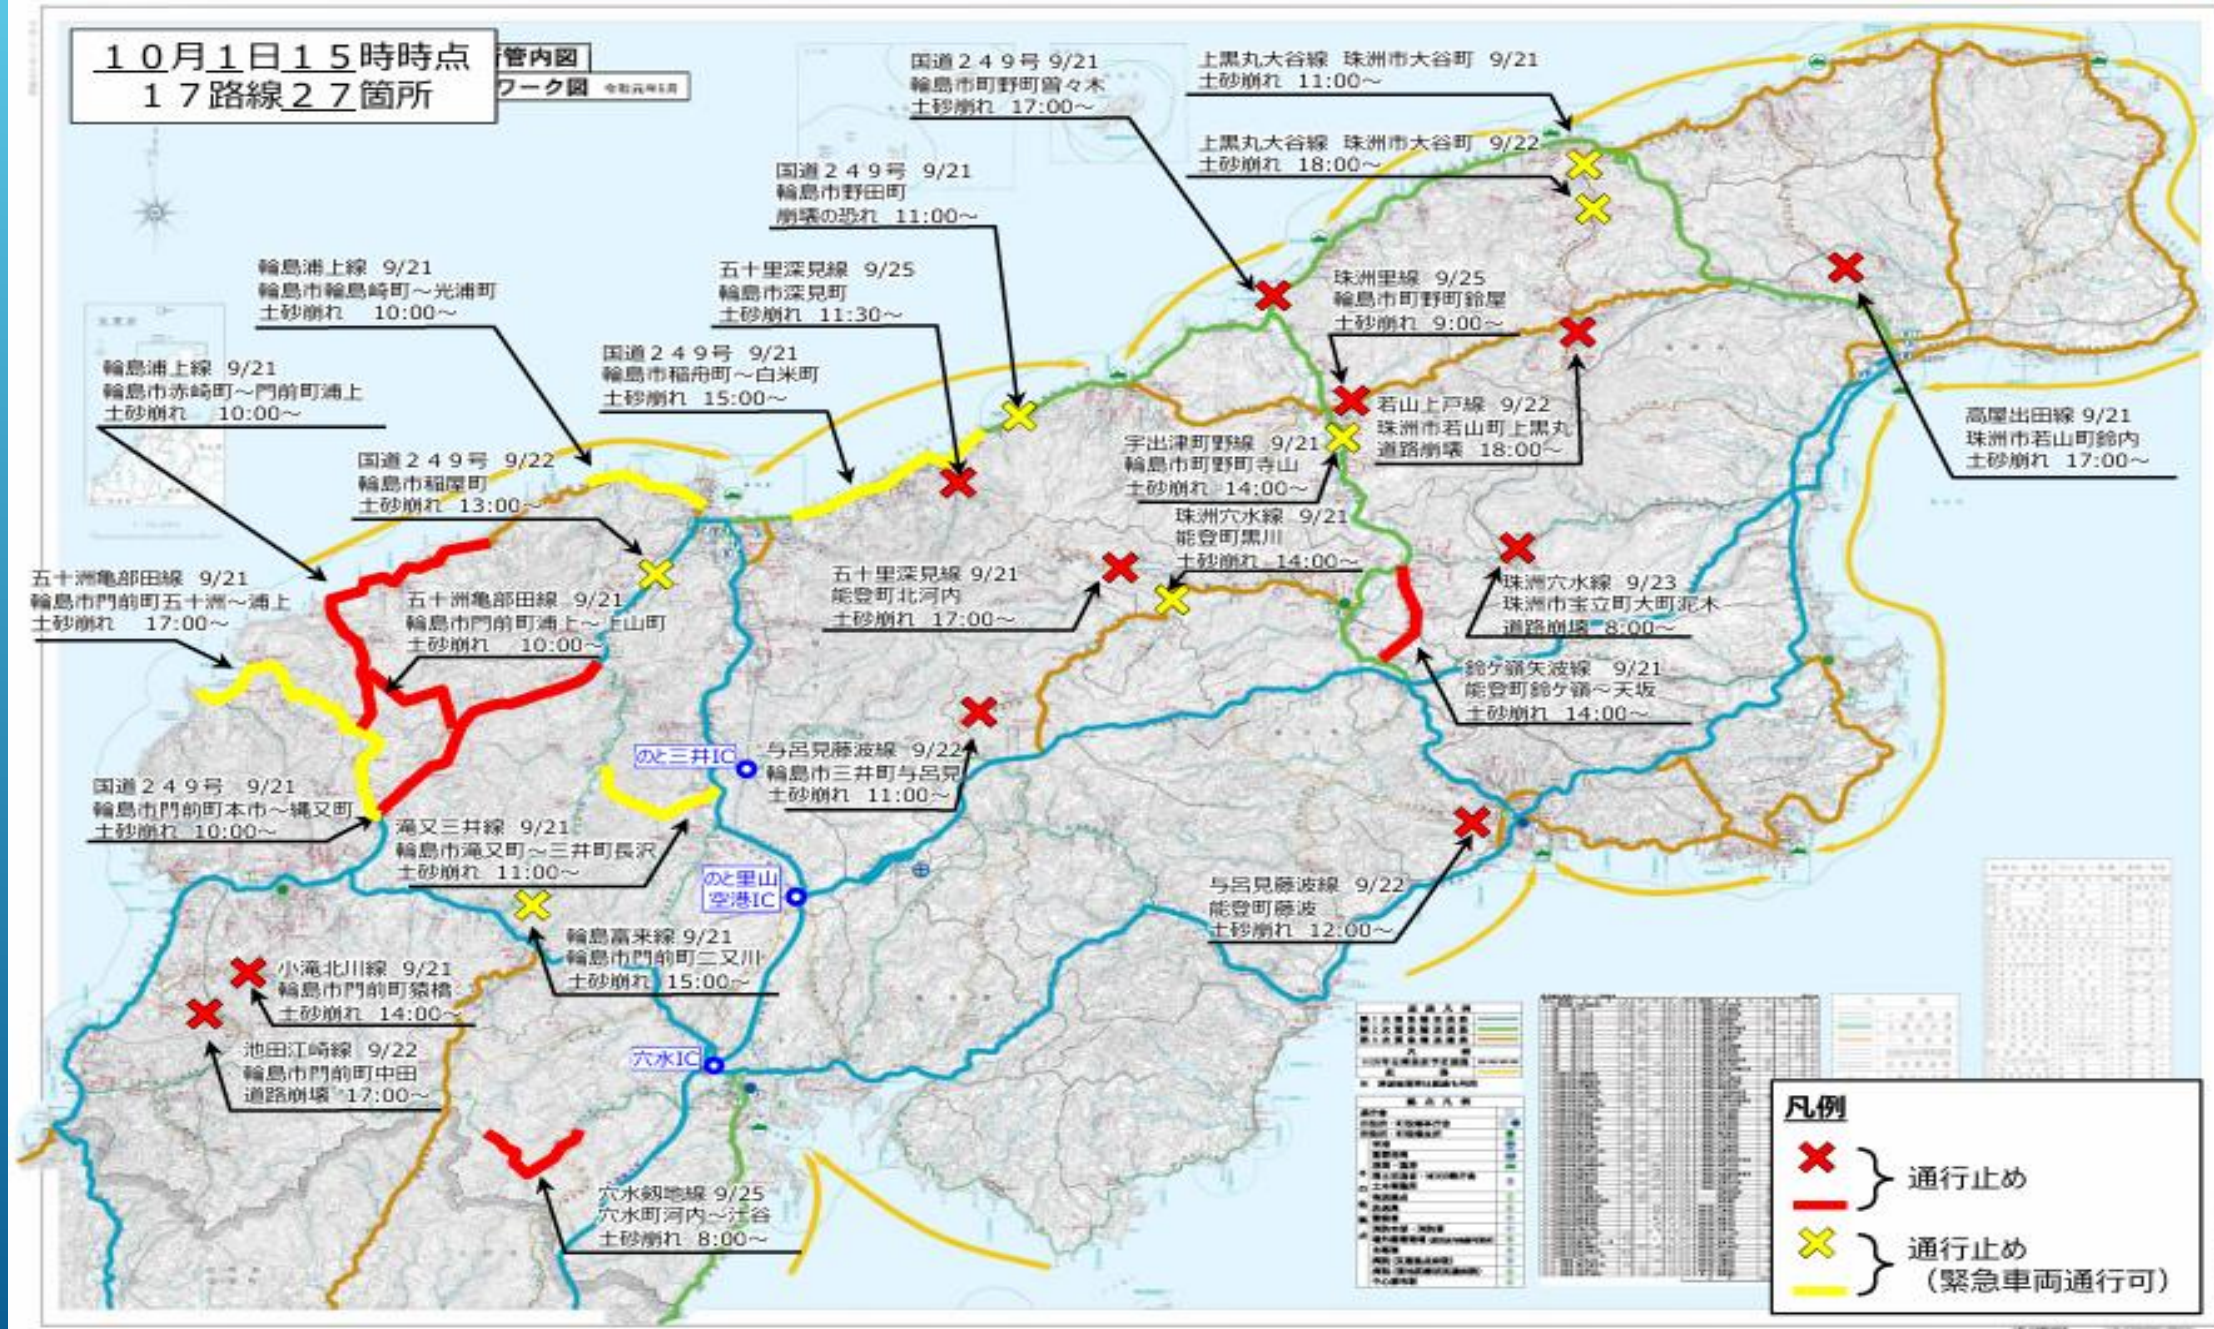


公費解体の進捗状況（令和7年2月末）



- 解体見込棟数39,235棟の **48.3%**となる **18,944棟**の解体が完了
- 2月単月 計画: 1,958棟 実績: 1,832棟 達成率: 94%
- 2月末累計 計画:18,560棟 実績:18,944棟 達成率:102%

大雪の影響により、2月単月の解体棟数は計画を下回ったものの、1月末累計が計画を510棟上回っていたため、2月末累計は計画を上回った。

加速化プラン【R6.8】												加速化プラン【R7.1改定】									
		R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10
解体計画	解体班数	8	56	120	247	601	661	982	1,120	1,211	1,256	973	1,021	1,100	1,200	1,200	1,200	1,200	1,100	800	482
	①解体棟数(各月)	15	163	288	610	1,112	1,208	2,036	2,348	2,400	2,265	2,450	1,958	2,749	3,099	3,098	3,005	3,095	2,380	2,005	1,244
	②" (累計)	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,432	7,780	10,180	12,445	16,602	18,560	21,309	24,408	27,506	30,511	33,606	35,986	37,991	39,235
	解体実施率(累計)	0.0%	0.5%	1.2%	2.7%	5.6%	8.7%	14%	20%	26%	32%	42%	47%	54%	62%	70%	78%	86%	92%	97%	100%
解体実績	③解体実績(各月)	15	163	288	610	1,112	1,208	1,700	2,638	3,286	3,132	2,960	1,832								
	④" (累計)	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,096	7,734	11,020	14,152	17,112	18,944								
	解体率(見込・累計)	0.0%	0.5%	1.2%	2.7%	5.6%	8.7%	13.0%	19.7%	28.1%	36.1%	43.6%	48.3%								
	計画達成率(各月) (③÷①)						100%	83%	112%	137%	138%	121%	94%								
	計画達成率(累計) (④÷②)	—	—	—	—	—	100%	94%	99%	108%	114%	103%	102%								

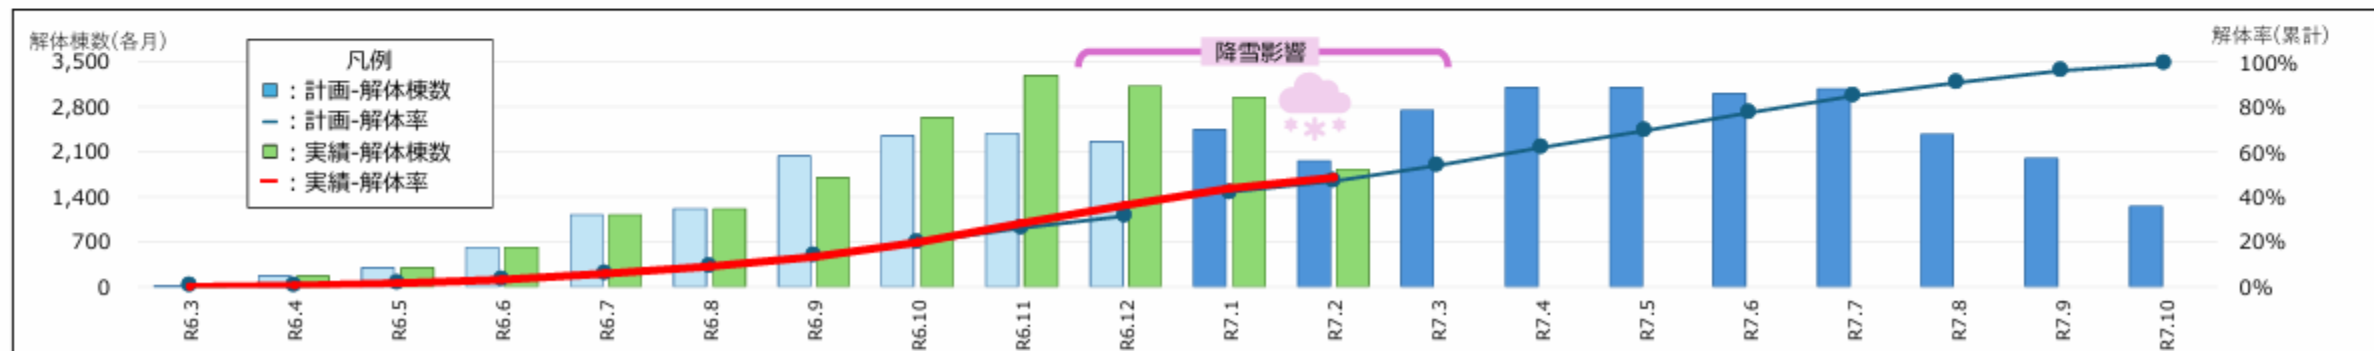

※令和6年能登半島地震と令和6年奥能登豪雨の合計

市町別の公費解体の状況（令和7年2月末）



市町	解体見込棟数 〔R7.1〕A	申請棟数	完了棟数 B				解体率 B÷A
				公費解体	緊急解体	自費解体	
珠州市	8,023 〔43〕	7,643 〔31〕	4,951 〔0〕	4,803 〔0〕	111 〔0〕	37 〔0〕	61.7% 〔0.0%〕
輪島市	11,267 〔276〕	11,050 〔99〕	5,137 〔0〕	4,872 〔0〕	229 〔0〕	36 〔0〕	45.6% 〔0.0%〕
能登町	3,951 〔16〕	3,552 〔8〕	1,739 〔0〕	1,696 〔0〕	2 〔0〕	41 〔0〕	44.0% 〔0.0%〕
穴水町	2,703	2,744	1,749	1,718	0	31	64.7%
七尾市	5,900	4,952	1,906	1,569	0	337	32.3%
志賀町	4,233	4,120	1,947	1,705	9	233	46.0%
その他	3,158	3,127	1,515	1,172	4	339	48.0%
計	39,235 〔335〕	37,188 〔138〕	18,944 〔0〕	17,535 〔0〕	355 〔0〕	1,054 〔0〕	48.3% 〔0.0%〕

※令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨の合計
〔 〕は、令和6年奥能登豪雨分であり、上段の棟数の内数

公費解体の解体完了目標等から逆算したスケジュール管理



- 令和7年10月末の公費解体完了から逆算し、**月ごとの解体計画**を設定
- 1棟あたりの解体日数について実績を基に変更（14日→12日（休日含む））
- 冬季の解体班数の減少を勘案し、**ピーク時1,200班体制**で、**1か月あたり最大約3,100棟を解体**

月ごとの解体計画


降雪影響



ピーク時1,200班
月最大約3,100棟解体

	R6.3	R6.4	R6.5	R6.6	R6.7	R6.8	R6.9	R6.10	R6.11	R6.12	R7.1	R7.2	R7.3	R7.4	R7.5	R7.6	R7.7	R7.8	R7.9	R7.10
解体班数	8	56	120	247	601	661	982	1,120	1,211	1,256	973	1,021	1,100	1,200	1,200	1,200	1,200	1,100	800	482
解体棟数(各月)	15	163	288	610	1,112	1,208	1,700	2,638	3,286	3,132	2,450	1,958	2,747	3,096	3,100	3,006	3,095	2,379	2,007	1,245
解体棟数(累計)	15	178	466	1,076	2,188	3,396	5,096	7,734	11,020	14,152	16,602	18,560	21,307	24,403	27,503	30,509	33,604	35,983	37,990	39,235
解体率(累計)	0.0%	0.5%	1.2%	2.7%	5.6%	8.7%	13%	20%	28%	36%	42%	47%	54%	62%	70%	78%	86%	92%	97%	100%


実績

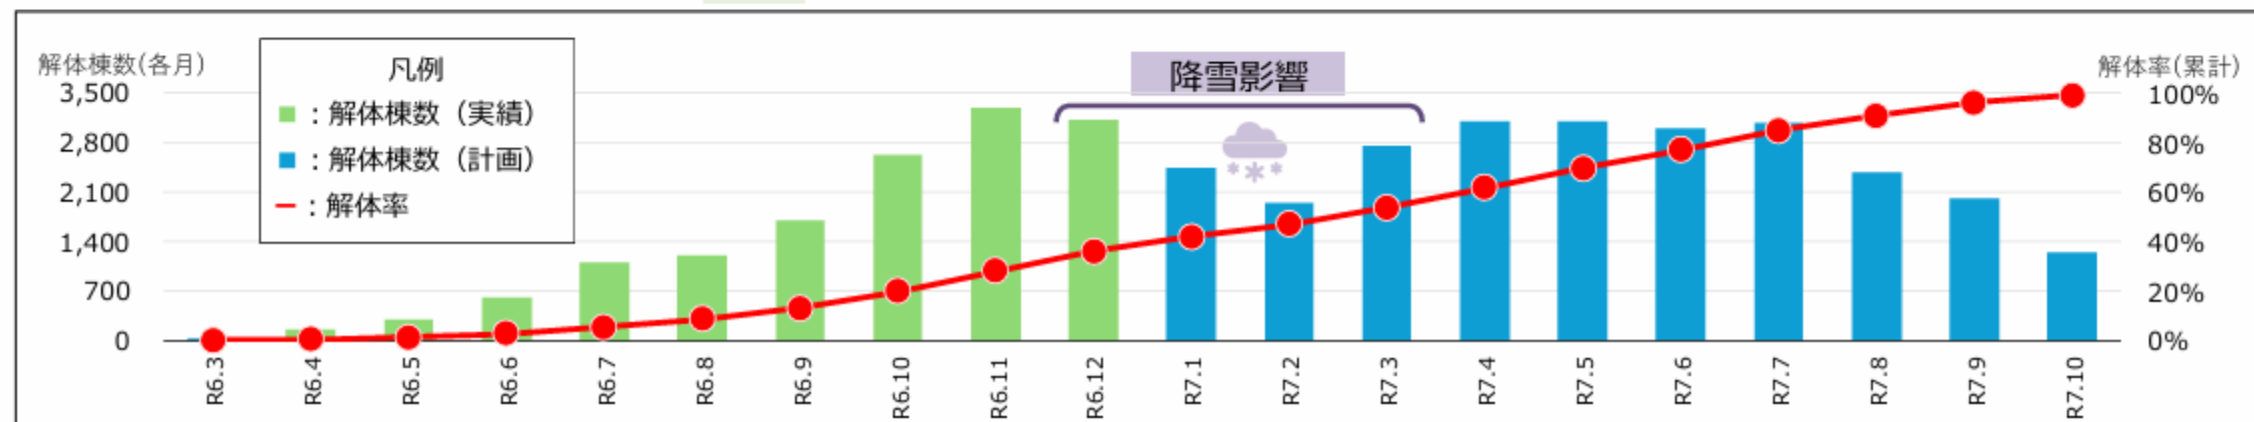

工程管理会議等を通じた進捗管理の徹底・情報共有の推進


- ◆ 石川県・6市町毎の工程管理会議を通じた「縦横連携」(※)の推進により、各工程・工程間でのボトルネックの把握・改善を行い、進捗管理を徹底
- ◆ 事業全体の進捗や取組事例などの情報共有を推進

〔※縦連携：申請審査・解体・仮置場・処理施設の各工程・工程間でのボトルネックの把握・改善
横連携：各市町における優良事例の共有と他市町への水平展開〕

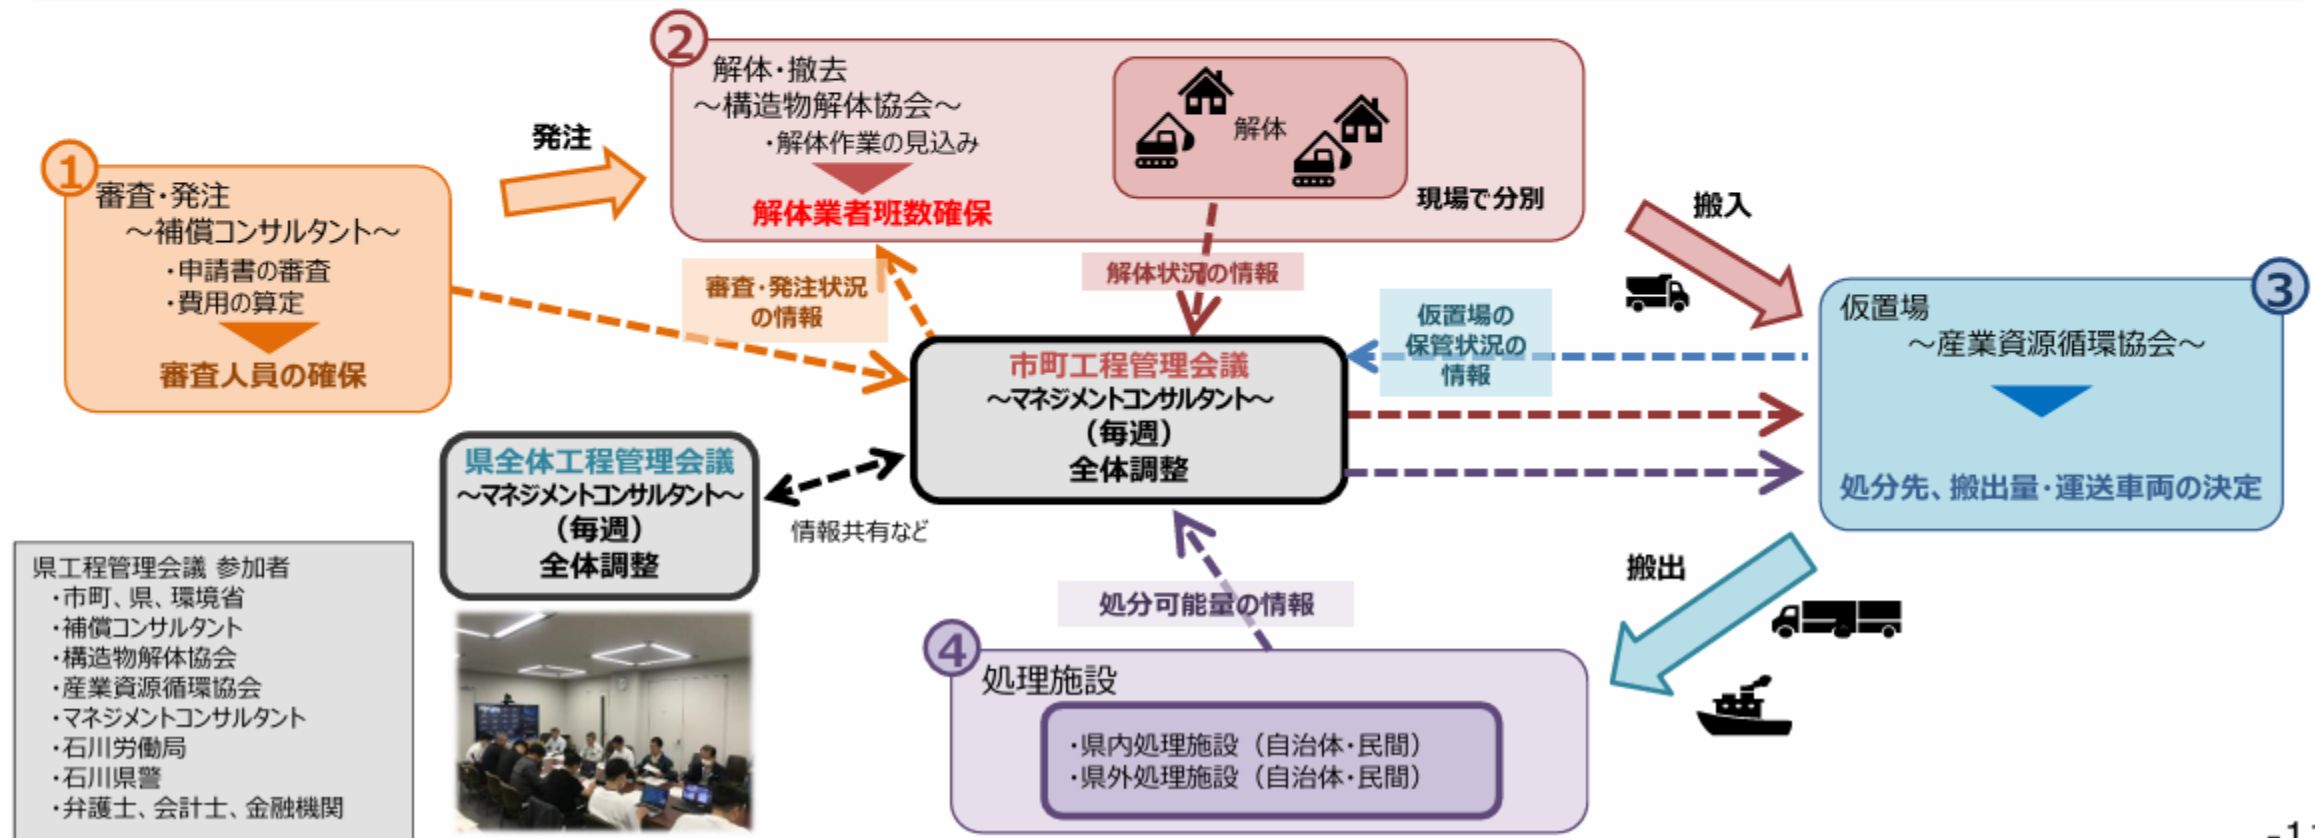

・公費解体の流れ

※石川県HPから

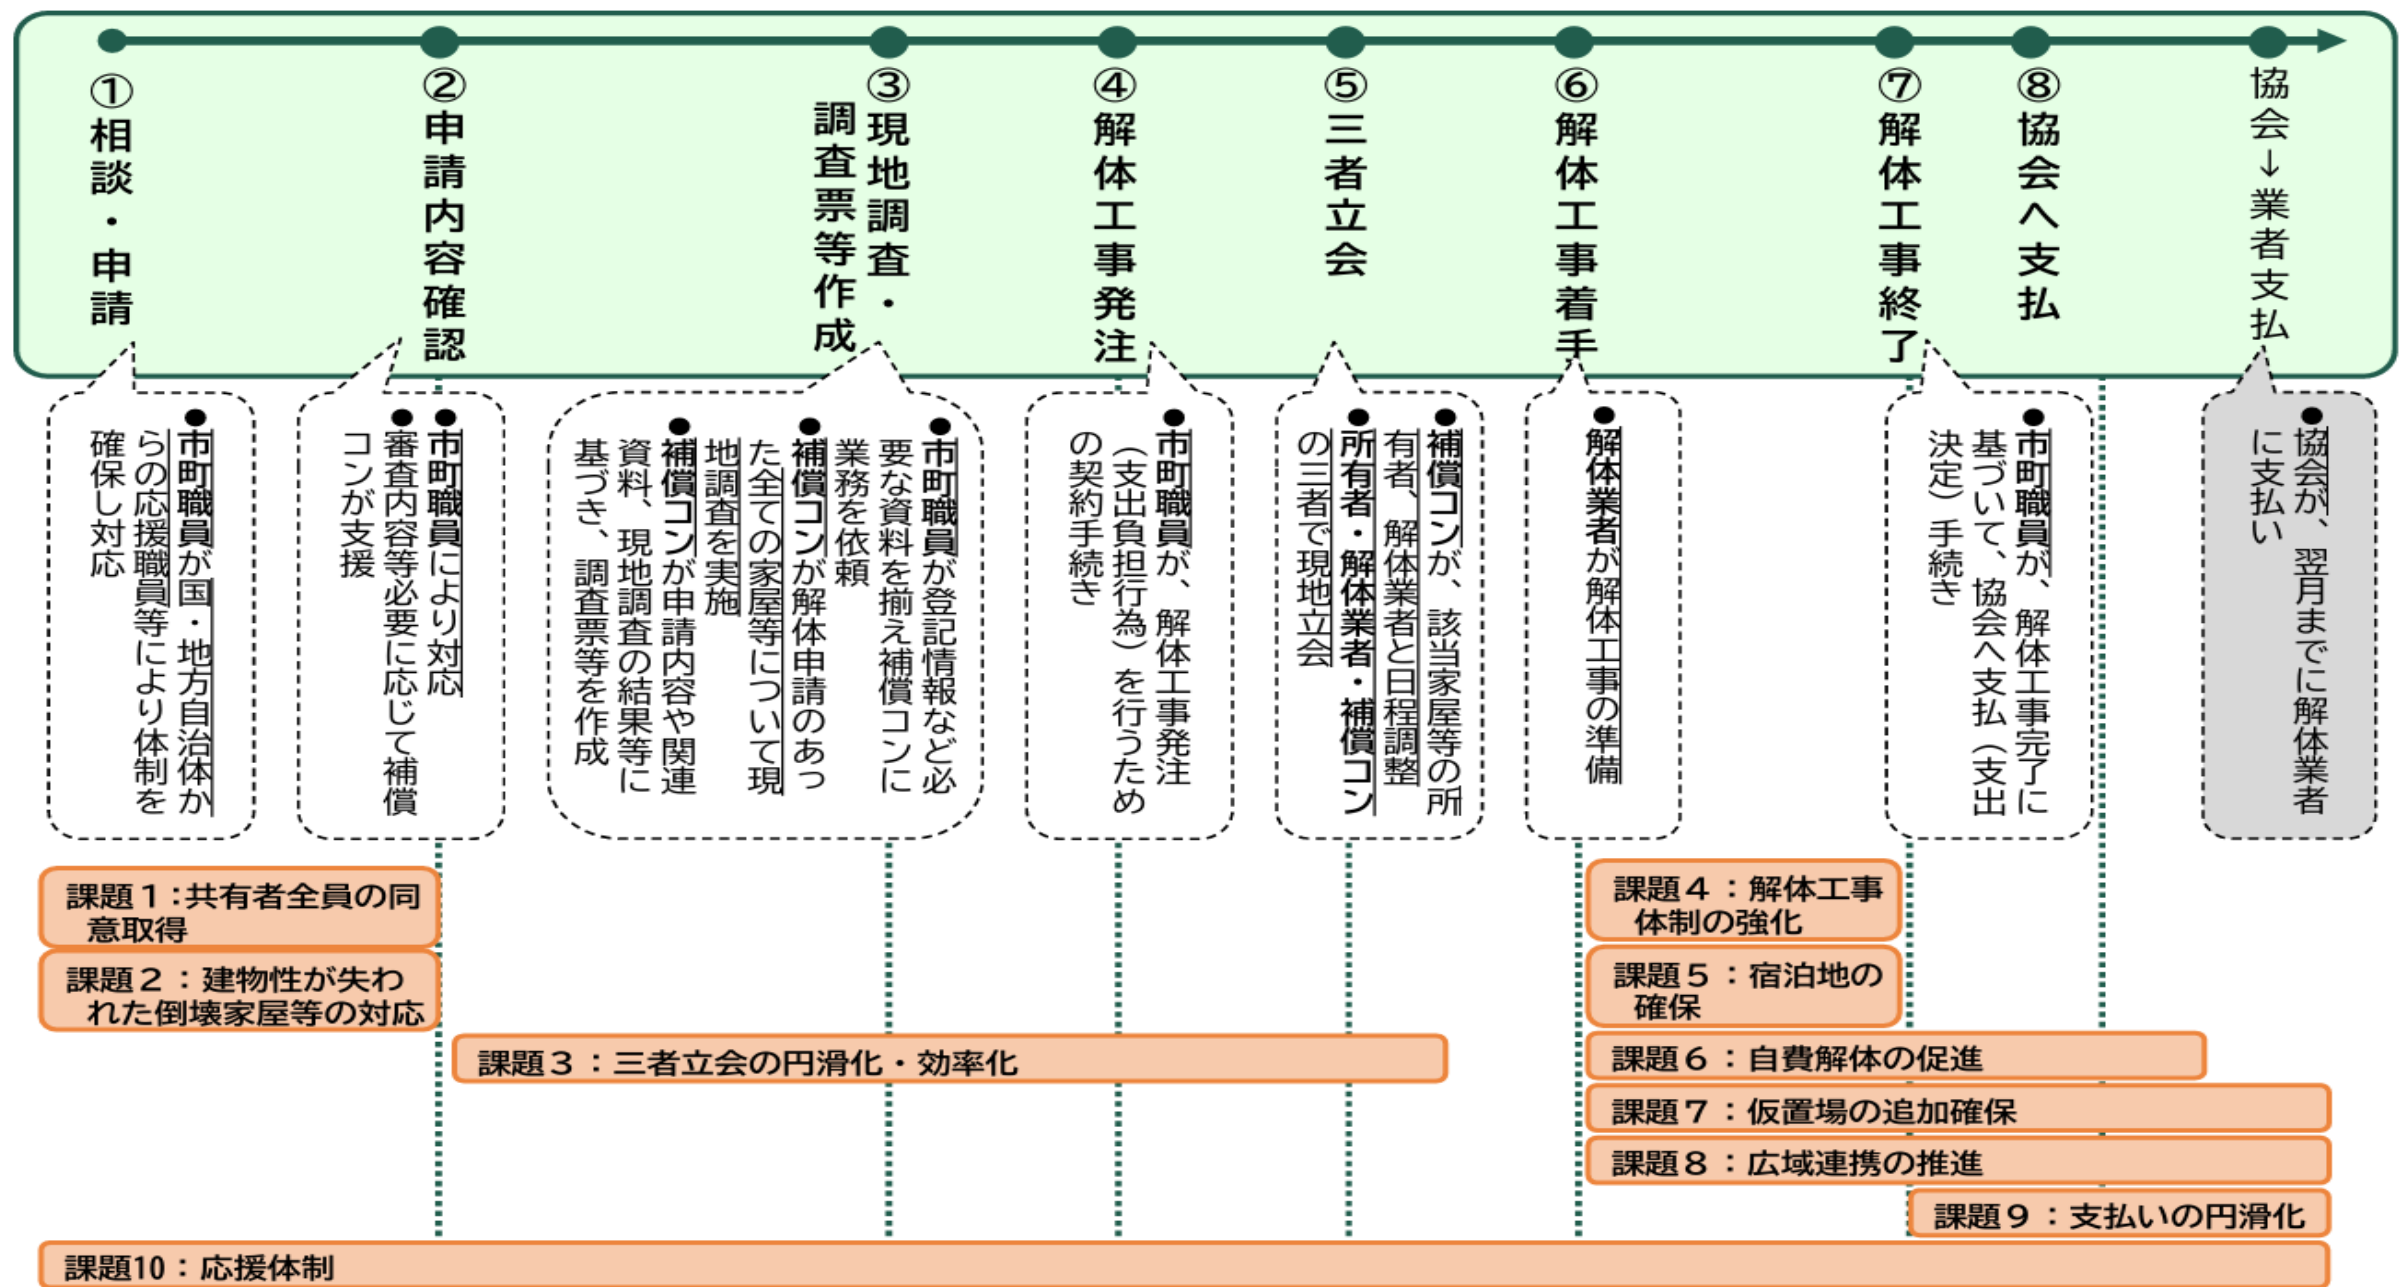

【今後の大規模災害に向けた対策について】

- ・ 構造物解体協会と産業資源循環協会との連携
- ・ 災害直後の宿泊先確保は国が最優先に指示整備
旅館やホテル、民間施設等との災害協定締結
- ・ 各市町における仮置場の候補地事前選定
- ・ 補償コンによる三者立会の円滑化・効率化
- ・ 公費解体申請受理後は各市町が主導権掌握、
申請者は行政の指示に従って行動
