

# 飯豊連峰保全連絡会 ニュースレター

(このニュースレターは飯豊連峰保全連絡会会員各位と合同保全作業に参加頂いた皆様にお送りしています)

発行者：飯豊連峰保全連絡会

## ■合同保全作業（玄山道分岐周辺）の報告について

平成 21 年 10 月 4 日（日）～7 日（水）、飯豊連峰の玄山道分岐周辺で、平成 21 年度の合同保全作業が行われました。今年 6 月 20 日の飯豊連峰保全連絡会議第 3 回会合で決定されたものです。


作業箇所は、玄山道分岐より御西岳方面に約 400m 進んだ標高約 1,900m の 1 箇所（施工箇所①）、更に御西岳方面に約 380m 進んだ標高約 1,920m の 1 箇所（施工箇所②）の計 2 箇所です。緑化ネット等の資材は東北地方環境事務所発注による玄山道分岐における登山道保全修復工事の予備資材を活用し、玄山道分岐から人力によって運搬しました。各箇所の作業の概要は以下のとおりです。

＜施工箇所①の作業について＞

- ・登山道が裸地化しているところに、緑化ネット 6 巻を敷設する作業を行いました。
- ・ガリー侵食が発生しているところに、現地の転石を用いて土留工 3 基を設置しました。

＜施工箇所②の作業について＞

- ・道が複線化しているため、登山者の侵入防止として、複線箇所入口に緑化ネット 1 巻を敷設する作業を行いました。

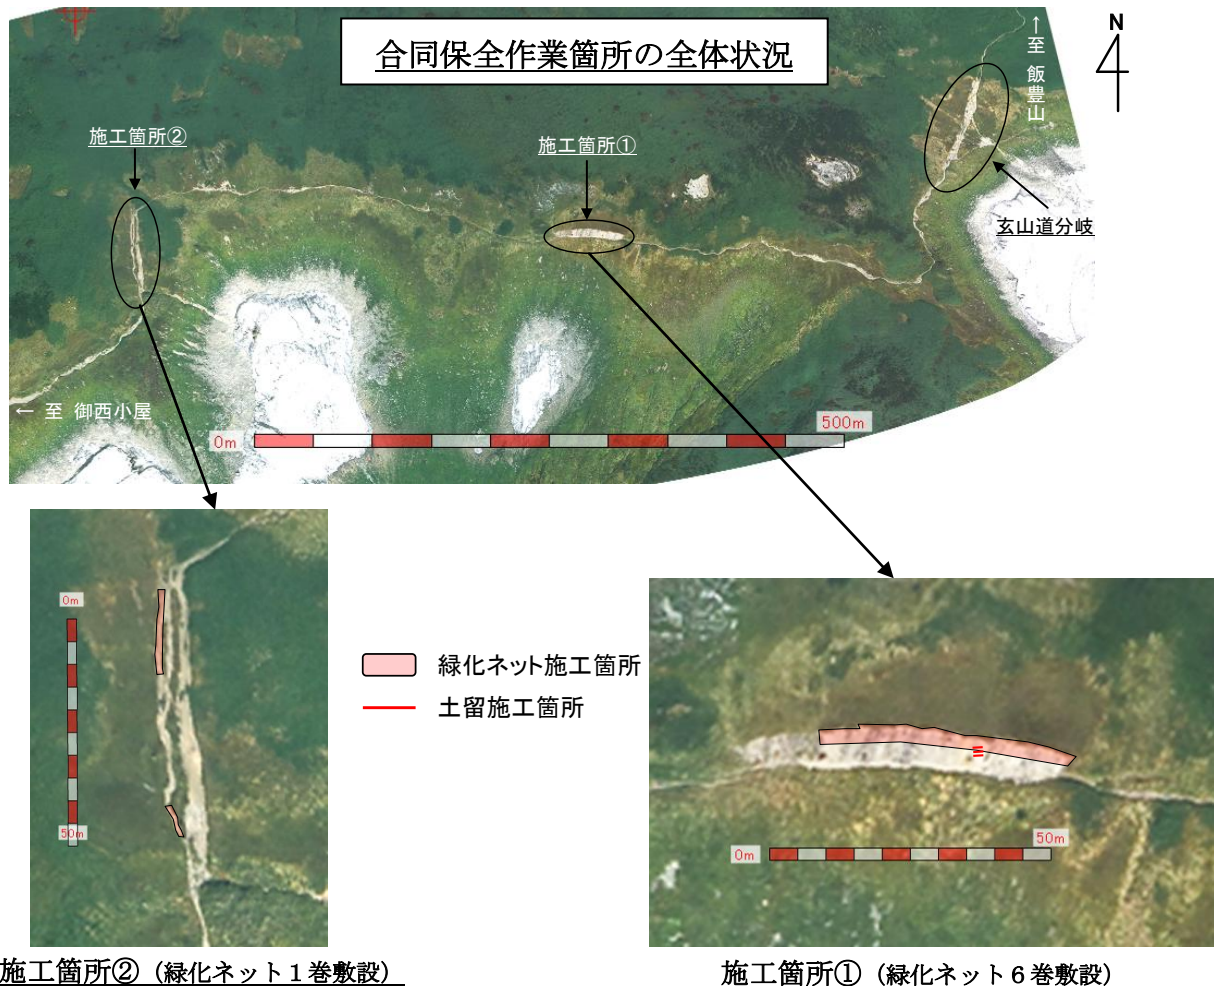



緑化ネットを施工箇所まで運搬します



緑化ネットを敷設し、上から転石を置きます



施工箇所① 土留工を設置



施工箇所① 作業終了



歩行者ルート

施工箇所② 複線箇所北側入口に緑化ネットを敷設



歩行者ルート

施工箇所② 複線箇所南側入口に緑化ネットを敷設

今回の作業は、東北地方環境事務所発注の玄山道分岐における登山道保全修復工事と平行して行われ、合同保全作業、登山道保全修復工事共に予定していた作業を全て終わることができました。今回の作業に関わって頂いた飯豊連峰を愛する多くの登山者や山岳関係者、地域の皆様に厚くお礼申し上げます。

参考 URL : <http://tohoku.env.go.jp/>

【発行者】

飯豊連峰保全連絡会

(事務局) 羽黒自然保護官事務所(佐藤、佐々木)

〒997-0141

山形県鶴岡市羽黒町荒川字谷地堰 39-4

TEL : 0235-62-4777

FAX : 0235-62-4537

E-mail : RO-HAGURO@env.go.jp
