

令和6年能登半島地震における災害廃棄物対策（令和6年1月26日7時時点）

災害廃棄物対策の基本方針：現地支援チームを被災地に派遣し、被災市町村のニーズに即してきめ細やかな対応

1. 生活ごみ処理（し尿・日常生活ごみ）

- 職員派遣、現地支援チーム設置、現地状況把握（人材バンクを活用した自治体職員の派遣）
- 避難所の仮設トイレ等からのし尿の回収・搬出
- 生活ごみ、片付けごみ等を処理する処理施設の被災復旧・代替施設の確保

2. 災害廃棄物撤去

- 災害廃棄物の仮置場の確保・設置
- 被災家屋の片付けごみ・家屋解体ごみ等の撤去・仮置場への搬出
- 全国の市町村や民間事業者等（災害廃棄物処理支援ネットワーク等）の応援による収集運搬支援

3. 災害廃棄物処理

- 仮置場からの搬出、処理施設での処理
- 周辺自治体や民間事業者等の受け入れによる広域処理

※環境省では、市町村の廃棄物処理施設の災害復旧及び市町村が行う災害廃棄物の処理（収集・運搬と処分、全壊・半壊家屋の公費解体）に対して補助を実施。

災害廃棄物処理の進捗状況（環境省による調整・対応状況等）

1. 生活ごみ処理（し尿・日常生活ごみ）

- 職員を現地派遣し、現地確認、助言等を実施。**能登地域6市町**（1/5～：輪島市、珠洲市、志賀町、能登町、穴水町、1/8～：七尾市）へ**常駐**し、現地確認や支援を実施。人材バンク制度を活用し、これまでに**災害廃棄物対応経験を有する自治体職員等36名（11自治体）**を石川県内**7市町**に派遣。
- 避難所等の仮設トイレのし尿について、**現地の状況をきめ細かく把握し適切な頻度での回収を実施**。
- 避難所の生活ごみや帰宅者の家庭ごみの収集については、**他自治体等からのごみ収集車の応援派遣と地元の車両により、平時と同様の回収体制を整えつつある**。また、**ごみ焼却施設の復旧・代替受入先の確保**による体制強化を順次実施中。
- 被災により稼働を停止した廃棄物処理施設の早期復旧に向けた**適確な財政支援**
- 生活ごみ・し尿について、災害時における広域処理に係る**かかりまし経費の支援**

2. 災害廃棄物撤去

- 災害廃棄物の仮置場を設置（石川県4市5町、新潟県10市1村、富山県7市町：他の自治体も順次設置予定。）。仮置場の適切な管理・運営に関する助言等の支援を実施中。
- 今般の災害によって生じた大量の災害廃棄物の迅速かつ円滑な処理に向けた**財政支援**
- 全壊家屋に加え、**特例的に半壊家屋も解体支援（自己負担ゼロ）**。
- 所有者不明空家の解体について、民法の新制度（**所有者不明建物管理制度**）等の**積極的活用**。
- 補助金や仮置場管理、家屋解体等に関する**被災自治体への説明会を順次実施**。

<災害廃棄物対策の流れ（イメージ）>



避難所のし尿処理の状況について

令和6年1月25日時点
環境省

現状

- バキュームカーで仮設トイレに溜まったし尿の回収を実施。※簡易トイレについては使用後に固形ごみとしてパッカー車で回収。
- 稼働停止となっていたし尿処理施設の復旧が進んだ他（7施設中3施設）、バキュームカーの輸送効率を向上すべく、停止中の3施設の受入タンクを一時受入施設として活用。また、七尾市の下水処理場においてし尿の受入処理を実施中。
- 避難所等に引き続き仮設トイレの設置を推進（経産省中心に1/21時点で約950基を設置済み（民間設置分の約280基を含む。））するとともに、各市町において、避難所の状況をきめ細かく把握し、適切な頻度で回収することを念頭にバキュームカーの運行を管理。

課題

- ① 回収体制の強化が進み、適切な頻度での回収体制を整えている状況であるが、引き続き、現場の個別の状況を的確に確認し、維持・徹底していく必要。
- ② 仮設トイレの衛生環境や利便性（和式→洋式への転換、夜間照明等）について、現場の課題を把握していくことが必要。また、一部の公衆トイレにおいて不適切な使用状況が確認され、衛生環境の確保が必要。
- ③ 簡易トイレから発生した固形ごみについても回収体制を確保しつつある状況。回収時の衛生面の確保（中身の飛散防止等）を含め、維持・徹底が必要。


対応

- ① 各市町の仮設トイレの設置状況をリスト化し自治体に提供する他、現地職員を通じて各市町におけるバキュームカーの運行状況を把握するなど、適切な頻度での回収が行われていることを確認。引き続き、現地へのきめ細かなサポートを実施。
- ② 環境省職員が避難所の仮設トイレの衛生環境の点検や避難者のニーズ把握を実施(1/25時点で約200箇所)。経産省から、洋式トイレアタッチメント450基・ランタン600個(1/18時点)を現地に送付している他、環境省と関係団体で連携し、消臭スプレー約2200本を配布中。また、県と連携して公衆トイレの状況を個別に確認し、衛生面を確保。
- ③ 固形ごみについて、地元自治体のパッカー車に加え、県内外の自治体や民間事業者の応援派遣により回収を実施。使用後簡易トイレの回収については色分けによる分別等、清掃業者への注意喚起を実施。

【仮設トイレからのし尿回収の流れ（イメージ）】



【使用後の簡易トイレの回収の流れ（イメージ）】

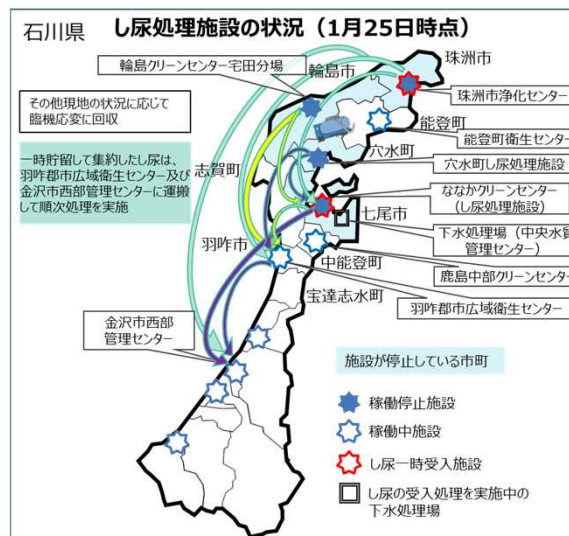

画像：経済産業省X（旧ツイッター）



石川県の生活ごみの収集運搬に関する対応状況

令和6年1月25日時点
環境省

現状

- 県内外の自治体や民間事業者から**支援車両を被災自治体に派遣**しており、地元の車両と併せて避難所ごみ及び家庭ごみの回収を実施。
- 被災により稼働停止となった**焼却施設4施設のうち3施設が復旧**し、施設による廃棄物の処理が再開。
- 処理施設が停止した地域では、収集した避難所ごみ及び家庭ごみを、焼却施設等に仮置きし、**県内又は県外の一般廃棄物焼却施設へ搬出中**。
- 一部の地域では収集するごみを限定する等の対応を行っている。


課題	対応
① 一般家庭から排出されるごみの収集に加え、避難所から排出されるごみを収集しており、 居住状況の変化や道路事情 などにより運搬効率が悪くなることで、 ごみ収集の遅れ などが生じないようにすることが重要。	① 環境省現地常駐者※が 避難所ごみ等の排出状況を確認 し、石川県と連携しながら、現場のごみの排出状況等に応じて 応援車両の派遣先の調整 などを実施。
② 停止中施設の 敷地内 などで、収集した避難所ごみ・家庭ごみを 一時受入・保管 しているところ、保管可能量を超えるおそれがあり、焼却施設の復旧までの 代替受入先の確保が必要 。	② 焼却施設の復旧対策と並行し、周辺自治体の焼却施設等による処理を増強するために、 必要に応じて受入先の確保や広域運搬方法を調整 。

※珠洲市、能登町、輪島市、穴水町、七尾市、志賀町の6市町に環境省職員を常駐派遣。

市町	回収頻度（避難所ごみ）*	運搬先
	回収頻度（家庭ごみ）*	
珠洲市	避難所の状況に応じ適宜対応	珠洲市浄化センター*** 県内外の処理施設（金沢市等）
	平時と同様（可燃ごみのみ）	
能登町	避難所の状況に応じ適宜対応	奥能登クリーンセンター *** 県内外の処理施設（金沢市等）
	毎日（可燃ごみのみ）	
輪島市	週に2回程度	輪島・穴水クリーンセンター*** 県内外の処理施設（金沢市等）
	平時と同様（可燃ごみと一部資源ごみ）	
穴水町	1回/3日程度	県内外の処理施設（金沢市等）
	平時と同様（可燃ごみのみ）	
七尾市	1回/日程度（可燃ごみ・衛生廃棄物**）	ななかリサイクルセンター
	平時と同様（可燃ごみのみ）	
志賀町	平時と同様（可燃ごみ）	リサイクルセンター（羽咋郡市）
	平時と同様（可燃ごみ・資源ごみ）	

*日により変動あり **オムツや携帯トイレ等 ***一時受入（敷地内）

【生活ごみの収集運搬の流れ（イメージ）】

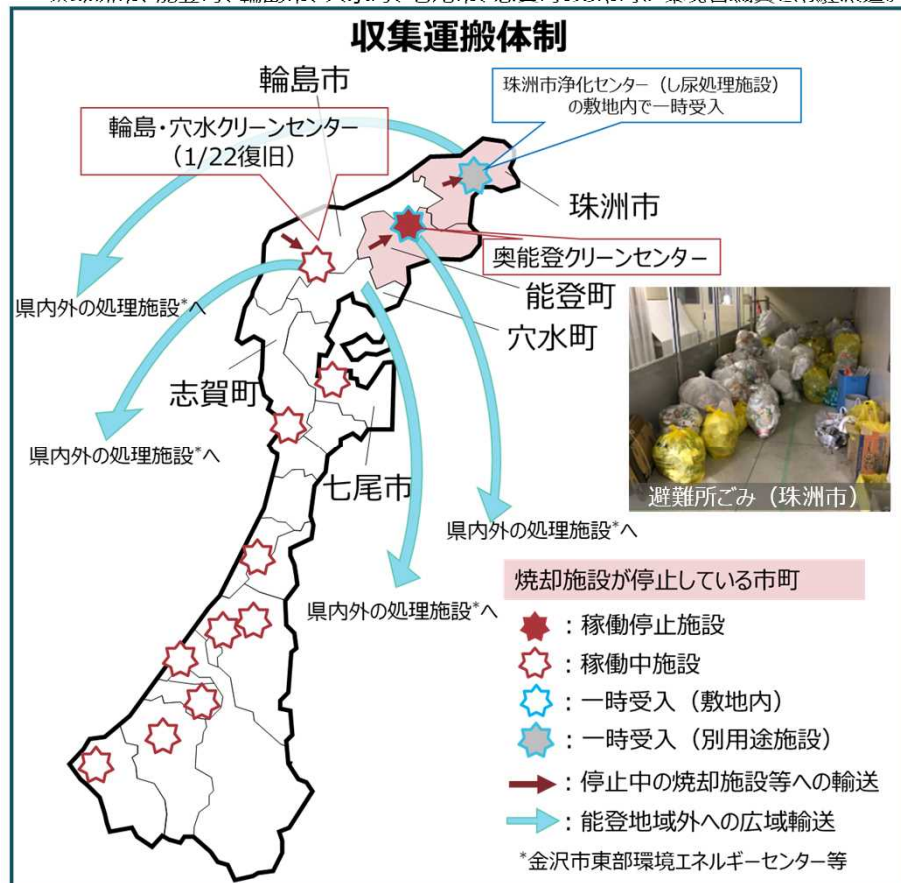

石川県・新潟県の被災したごみ焼却施設・し尿処理施設等の状況（令和6年1月25日時点）



被災施設数：

石川県 11 施設

うち復旧施設：6 施設
うち代替措置：4 施設
うち調整中：1 施設

新潟県 1 施設
調整中

石川県のごみ焼却施設等の状況

現状

- 4施設が被災。3施設が復旧。停止中の1施設については、施設復旧までの間、敷地内での仮置きを実施中。

課題	対応
① 処理施設の早期復旧	① 各施設のプラントメーカーと連携し、早期復旧に取り組む。
② 避難所や停止中の施設で保管している廃棄物の受入処理施設の確保。	② 排出状況に応じて広域的な処理を調整。

石川県のし尿処理施設の状況

現状



- 7施設が被災。3施設が復旧。停止中の4施設のうち3施設では受入タンクを一時貯留基地として利用中。
- 一部、下水処理場を利用した処理を実施。
- 仮設トイレの急速な増設に併せて回収体制を順次強化。

課題	対応
処理施設の早期復旧	各施設のプラントメーカーと連携し、早期復旧に取り組む。

施設名称	見通し	対応状況	処理能力
奥能登 クリーンセンター		調整中：施設内仮置き後、県内外の処理施設へ輸送	30t/日
輪島・穴水 クリーンセンター	1/22 復旧	-	35t/日
ななか リサイクルセンター	1/11 復旧	-	70t/日
リサイクルセンター (羽咋郡市)	1/12 復旧	-	66t/日

施設名称	見通し	対応状況	処理能力
珠洲市 浄化センター		代替措置： 貯留ピットに一時貯留後に輸送	29kL/日
能登町 衛生センター	1/9 復旧	-	25kL/日
輪島 クリーンセンター-宅田分場		代替措置： 貯留ピットに一時貯留後に輸送	40kL/日
穴水町 し尿処理施設		代替措置： ななかクリーンセンターの貯留ピットに一時貯留後に輸送	7kL/日
ななか クリーンセンター		代替措置： 貯留ピットに一時貯留後に輸送	79kL/日
鹿島中部 クリーンセンター	1/9 復旧	- (※1系統運転で対応)	6.2kL/日
衛生センター (羽咋郡市)	1/9 復旧	-	80kL/日

施設名称	見通し	対応状況	処理能力
燕・弥彦総合事務組合 環境センター		2施設中1施設は休止 (※残った1施設で処理を継続するとともに、長岡市と三条市にて処理を実施(1/22~3/29)。)	237t/日

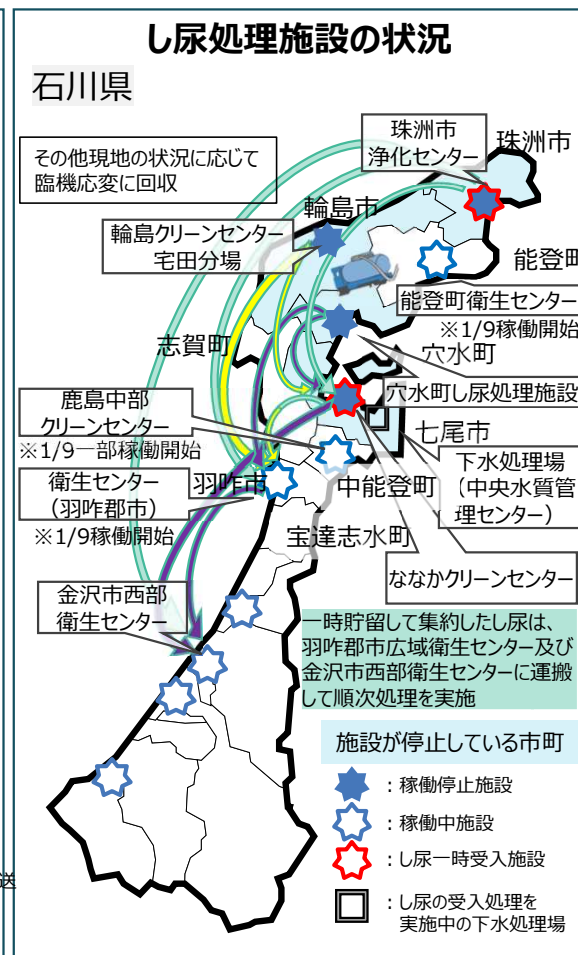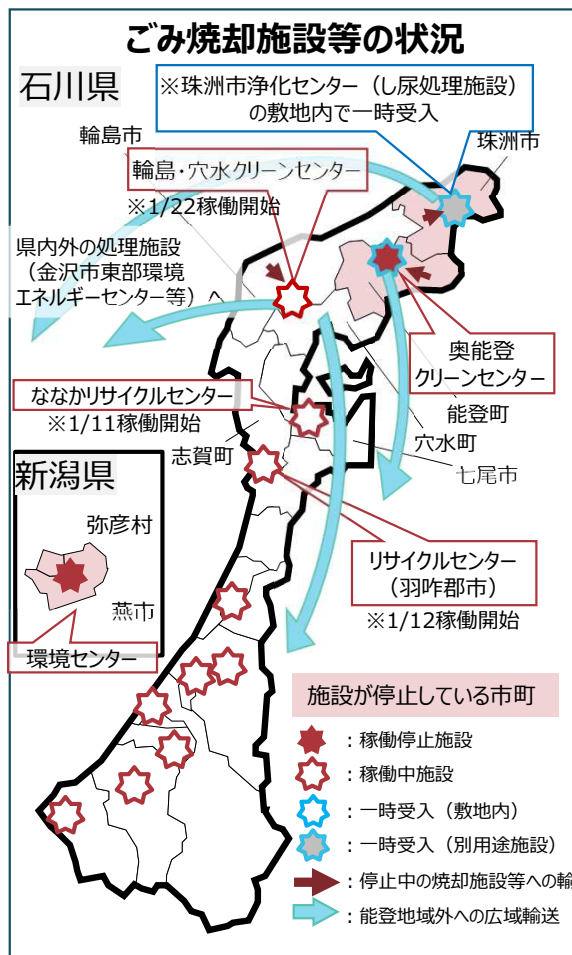

災害廃棄物の仮置場設置状況（令和6年1月25日時点）



現状

■ 多くの市町村で仮置場が設置され、片付けごみ等が順次搬入。仮置場が未設置の市町においては、候補地の選定や開設後の管理・運営に向けた準備が進められている。

課題	対応
① 仮置場設置にあたり、搬入路のアクセスや候補地の地面の状況が悪いことや、運営管理に係る要員不足などが課題。	① 派遣した職員や他市町からの支援員が仮置場候補地を巡回し、アクセス可能な車両等での仮置場対応、敷鉄板の設置、災害廃棄物の配置、災害廃棄物の分別方法等の留意点を確認する。要員が不足する場合には、運営管理を民間事業者へ委託。
② 設置済の仮置場において、搬入物の分別や適切な保管が行われないと、処理の長期化や火災発生などが起こり得る。	② 派遣した職員や技術専門家が搬入物の分別や保管の状況を現地確認し、必要に応じて助言等を行う。
③ 各市町が設置した仮置場以外の敷地に、住民等による片付けごみが一時的に集積することにより、交通の妨げ等の事態が起こり得る。	③ 仮置場の設置について事前又は早期に周知を行う。市中を巡回する際には、こうした一時集積所が発生していないか確認するとともに、発生を確認した場合は速やかに一次仮置場へ集約し、解消する。
④ 自力での片付け、搬出、仮置場への持ち込み等が困難な住民（高齢者世帯等）への支援が課題。	④ ボランティアと連携した被災家屋からの片付けごみ等の撤去・搬出を行う。また、戸別収集による支援についても対応を検討。
⑤ 住民が片付けごみを仮置場に搬入する際に、周辺に渋滞が発生し得る。	⑤ 仮置場の立地・規模等に応じた車両動線の整理と誘導員の配置を行う。

石川県 設置済：9、調整中：4

自治体名	仮置場設置状況	設置数
金沢市	設置済：1/4～1/14受付終了	1
七尾市	設置済：1/12～	1
小松市	設置済：1/4～	1
輪島市	調整中：候補地あり	
珠洲市	調整中：候補地あり	
羽咋市	設置済：1/12～	1
かほく市	調整中：候補地あり	
内灘町	設置済：1/22～	1
志賀町	設置済：1/17～	1
宝達志水町	設置済：1/14～	1
中能登町	設置済：1/20～	1
穴水町	設置済：1/18～	1
能登町	調整中：候補地あり	

富山県 設置済：7

自治体名	仮置場設置状況	設置数
高岡市	設置済：1/3～	1
氷見市	設置済：1/4～	1
砺波市	設置済：1/9～	1
小矢部市	設置済：1/13～	1
南砺市	設置済：1/6～	1
射水市	設置済：1/4～	1
上市町	設置済：1/4～ ～1/21受付終了	1

新潟県 設置済：11

自治体名	仮置場等設置状況*	設置数
新潟市	設置済：1/3～	7
長岡市	設置済：1/9～	2
三条市	設置済：1/5～	1
柏崎市	設置済：1/11～	1
燕市	設置済：1/5～	2
糸魚川市	設置済：1/8～1/21受付終了	3
妙高市	設置済：1/5～1/19受付終了	2
五泉市	設置済：1/5～	1
上越市	設置済：1/5～	4
佐渡市	設置済：1/9～	3
刈羽村	設置済：1/11～	1

*※市町村焼却施設又は処分業者へ直接持ち込みを含む

※太字は環境省職員常駐の6市町

